

Previsão de Faturamento

GTK PRÉ-MOLDADOS LTDA · CNPJ 66.492.016/0001-77 · Rodovia BR/ES-381, km 35 — Zona Rural, São Mateus – ES

RECEITA DE ESTABILIZAÇÃO	TETO DE PEQUENA EMPRESA	CAPACIDADE EFETIVA ANUAL	UTILIZAÇÃO NO REGIME
R\$ 4.791.000	R\$ 4.800.000	R\$ 5.732.361	84%

Esta previsão abre a receita projetada de **R\$ 4.791.000** por produto, por mês e por ano. Os totais anuais são os do plano de negócios auditado; o que este documento acrescenta é a *distribuição*: quando cada produto entra na venda, como a demanda se comporta ao longo do ano e quanto da capacidade da fábrica é efetivamente utilizada. Valores constantes de agosto de 2026 (sem projeção de inflação), padrão dos projetos de financiamento.

1 Linha do tempo a partir de agora

PERÍODO	FASE	FATURAMENTO	MARCOS
ago-dez/2026	Implantação	R\$ 0	Protocolo FNE; licença ambiental (IEMA) e ligação EDP; galpão e terraplanagem; entrega Gervasi (150-180 dias da proposta de 12/05/2026); montagem (~10 dias); startup, formulação de traços e ensaios NBR 6136/9781
jan-dez/2027	Ano 1 — operação	R\$ 2.750.000	Ramp-up comercial com entrada escalonada dos produtos (detalhe na seção 3)
2028	Ano 2 — consolidação	R\$ 3.850.000	Canais maduros: revendas, construtoras e licitações
2029-2038	Regime	R\$ 4.791.000/ano	Plano-base no teto de pequena empresa (LC nº 123/2006, art. 3º, II)

2 Como a previsão foi construída

CAMADA 1 — O QUE O MERCADO COMPRA DE CADA PRODUTO

As horas da planta são alocadas na proporção em que cada família de produto participa do valor do mercado regional, e não na proporção em que a máquina produz mais rápido. O mix migra ano a ano para produtos de maior valor, conforme a certificação é emitida e os canais amadurecem.

PRODUTO	PREÇO	ANO 1	ANO 2	REGIME	CANAL PREDOMINANTE
Bloco de concreto 14x19x39 - vedação	R\$ 3,43	34,9%	31,8%	30,1%	Revendas e balcão (autoconstrução)
Bloco de concreto 14x19x39 - estrutural	R\$ 4,17	20,8%	20,7%	20,6%	Construtoras e habitação econômica
Canaleta de concreto 14x19x39	R\$ 4,41	3,0%	3,2%	3,3%	Vergas e cintas da alvenaria estrutural
Bloco de concreto 9x19x39 - vedação	R\$ 2,75	14,6%	13,3%	12,6%	Divisórias internas e muros
Bloco de concreto 9x19x39 - estrutural	R\$ 2,72	1,5%	1,4%	1,4%	Divisórias de obra estrutural
Canaleta de concreto 9x19x39	R\$ 2,98	0,5%	0,5%	0,5%	Vergas de divisória
Bloco de concreto 19x19x39 - vedação	R\$ 4,26	0,7%	0,8%	0,9%	Muros e paredes de maior espessura
Bloco de concreto 19x19x39 - estrutural	R\$ 5,47	4,1%	4,7%	5,0%	Paredes de maior carga e galpões
Canaleta de concreto 19x19x39	R\$ 5,29	0,4%	0,5%	0,6%	Cintas de galpão e obra pesada
Piso intertravado (paver) 6 cm - 35 MPa	R\$ 57,73/m²	8,1%	8,7%	9,0%	Calçadas, condomínios e obra privada
Piso intertravado (paver) 8 cm - 50 MPa	R\$ 65,83/m²	11,4%	14,4%	16,0%	Prefeituras, Calçamento Rural (SEAG) e pátios

CAMADA 2 — QUANDO CADA PRODUTO ENTRA

PRODUTO	ENTRA EM
Blocos de vedação 9 e 14	mês 1
Blocos estruturais 9 e 14	mês 3
Canaletas 9 e 14	mês 4
Paver 6 cm — obras privadas	mês 4
Blocos de 19 (vedação e estrutural)	mês 5
Canaleta 19 e paver 8 cm (B2G)	mês 6


O estrutural depende dos ensaios NBR 6136 e do laudo do primeiro traço; o paver público depende de cadastro nas prefeituras, atas e empenho; as canaletas acompanham obras de alvenaria estrutural já iniciadas.

CAMADA 3 — SAZONALIDADE DA CONSTRUÇÃO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,75	0,85	1,00	1,05	1,10	1,10	1,10	1,15	1,15	1,15	1,00	0,60
30%	45%	60%	70%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%

Primeira linha: índice sazonal (soma 12,00). Segunda: curva de ramp-up do ano 1. Janeiro e fevereiro são historicamente os piores meses de venda de cimento no país (chuvas, férias e Carnaval); dezembro concentra férias coletivas e a parada anual de revisão prevista no estudo.

3 Ano 1 mês a mês — R\$ 2.750.000

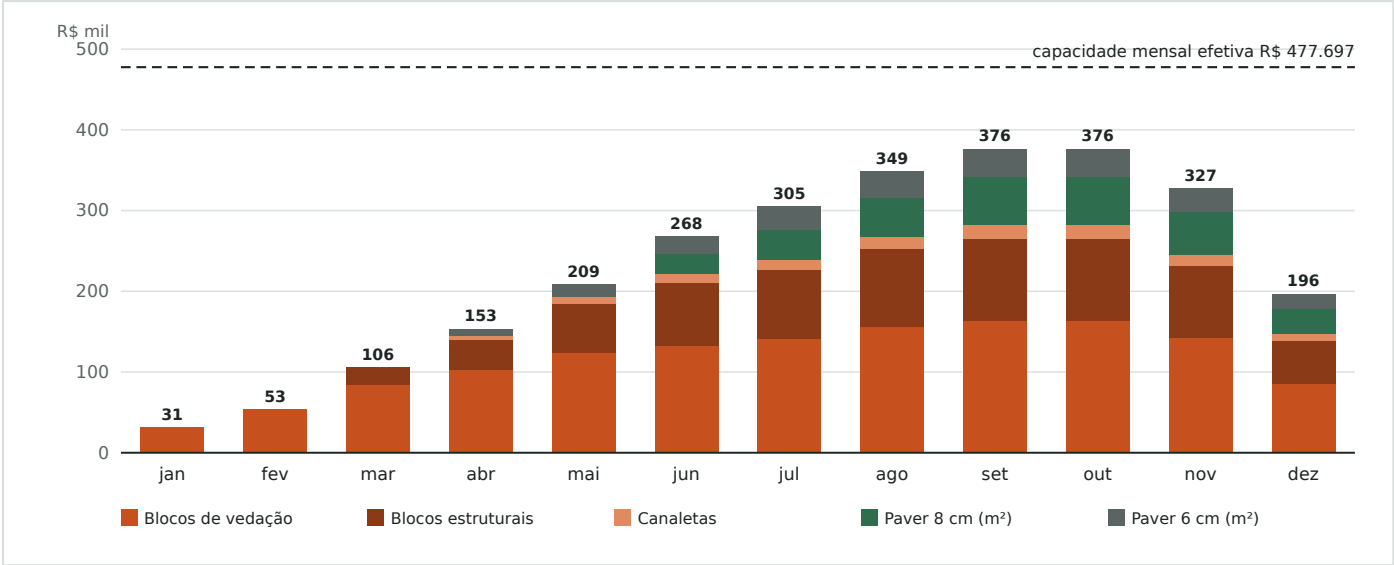

MÊS	BLOCOS DE VEDAÇÃO	BLOCOS ESTRUTURAIS	CANALETAS	PAVER 8 CM (M²)	PAVER 6 CM (M²)	RECEITA	DIAS PROD.	% CAPAC.	MARCO DO MÊS
jan/2027	31.453	—	—	—	—	31.453	1,2	7%	início: vedação no varejo e vendas
fev/2027	53.469	—	—	—	—	53.469	2,1	11%	
mar/2027	83.874	21.633	—	—	—	105.507	4,0	22%	entra o bloco estrutural (laudo NBR)
abr/2027	102.745	37.101	4.551	—	8.641	153.038	5,8	32%	entram canaletas e paver 6 cm (obras privadas)
mai/2027	124.295	61.163	7.628	—	15.519	208.605	7,8	44%	entram os blocos de 19
jun/2027	132.608	78.170	10.698	24.508	21.985	267.969	9,8	56%	entra o paver 8 cm (B2G) e a canaleta 19
jul/2027	140.841	85.206	13.529	36.329	29.098	305.003	11,1	64%	
ago/2027	155.900	96.719	15.230	48.681	32.111	348.641	12,6	73%	
set/2027	164.105	101.809	16.347	60.286	33.801	376.349	13,6	79%	
out/2027	164.105	101.809	16.347	60.286	33.801	376.349	13,6	79%	
nov/2027	142.700	88.530	14.215	52.423	29.392	327.260	11,8	69%	
dez/2027	85.620	53.118	8.529	31.454	17.635	196.356	7,1	41%	férias coletivas e parada de revisão
TOTAL	1.381.717	725.259	107.072	313.967	221.985	2.750.000	100,5	—	

Nenhum mês ultrapassa **79% da capacidade mensal efetiva** (R\$ 477.697), e o ano consome **100,5 dos 207 dias efetivos** disponíveis — o ramp-up cabe na planta com folga, sem segundo turno nem hora extra.

4 Evolução anual e quantidades

ANO	CALENDÁRIO	RECEITA	DIAS DE PRODUÇÃO	% CAPAC. EFETIVA	FASE
1	2027	R\$ 2.750.000	100,5	49%	ramp-up
2	2028	R\$ 3.850.000	139,6	67%	consolidação
3	2029	R\$ 4.791.000	173,0	84%	regime — teto EPP
4	2030	R\$ 4.791.000	173,0	84%	regime — teto EPP
5	2031	R\$ 4.791.000	173,0	84%	regime — teto EPP
6	2032	R\$ 4.791.000	173,0	84%	regime — teto EPP
7	2033	R\$ 4.791.000	173,0	84%	regime — teto EPP
8	2034	R\$ 4.791.000	173,0	84%	regime — teto EPP
9	2035	R\$ 4.791.000	173,0	84%	regime — teto EPP
10	2036	R\$ 4.791.000	173,0	84%	regime — teto EPP
11	2037	R\$ 4.791.000	173,0	84%	regime — teto EPP
12	2038	R\$ 4.791.000	173,0	84%	regime — teto EPP

QUANTIDADES VENDIDAS E PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO (FORMATO DO FORMULÁRIO DO BANCO)

PRODUTO	PREÇO UNIT.	ANO 1	ANO 2	REGIME (QTD. PROJETADA)	% ANO 1	% ANO 2	% ANO 3+
Bloco de concreto 14x19x39 - vedação	R\$ 3,43	279.551 un	356.454 un	420.180 un	66,5%	84,8%	100%
Bloco de concreto 14x19x39 - estrutural	R\$ 4,17	137.063 un	190.757 un	236.623 un	57,9%	80,6%	100%
Canaleta de concreto 14x19x39	R\$ 4,41	18.908 un	27.895 un	35.667 un	53,0%	78,2%	100%
Bloco de concreto 9x19x39 - vedação	R\$ 2,75	146.432 un	186.714 un	220.094 un	66,5%	84,8%	100%
Bloco de concreto 9x19x39 - estrutural	R\$ 2,72	14.685 un	20.438 un	25.352 un	57,9%	80,6%	100%
Canaleta de concreto 9x19x39	R\$ 2,98	4.267 un	6.295 un	8.049 un	53,0%	78,2%	100%
Bloco de concreto 19x19x39 - vedação	R\$ 4,26	4.735 un	7.546 un	10.004 un	47,3%	75,4%	100%
Bloco de concreto 19x19x39 - estrutural	R\$ 5,47	20.797 un	33.144 un	43.944 un	47,3%	75,4%	100%
Canaleta de concreto 19x19x39	R\$ 5,29	2.074 un	3.665 un	5.070 un	40,9%	72,3%	100%
Piso intertravado (paver) 6 cm - 35 MPa	R\$ 57,73	3.845 m²	5.777 m²	7.454 m²	51,6%	77,5%	100%
Piso intertravado (paver) 8 cm - 50 MPa	R\$ 65,83	4.769 m²	8.426 m²	11.658 m²	40,9%	72,3%	100%

Na aba Receitas/Atividades do banco, a empresa entra com **Qtd. Atual = 0** (implantação) e **Qtd. Produzida = % de Utilização × Qtd. Projetada**. Os percentuais menores do ano 1 no estrutural, nas canaletas e no paver não são conservadorismo genérico: são a tradução numérica do calendário de entrada da camada 2.

5 Alerta: valores constantes × valores nominais

A projeção acima está em valores constantes de agosto de 2026 — padrão dos projetos de financiamento e conservador, porque não conta com reajuste de preços. Cabe registrar a consequência prática dessa escolha:

ANO	CALENDÁRIO	RECEITA NOMINAL (+4% A.A.)	SITUAÇÃO FRENTE AO TETO EPP
3	2029	R\$ 4.791.000	dentro do teto
4	2030	R\$ 4.982.640	ACIMA — decidir porte
5	2031	R\$ 5.181.946	ACIMA — decidir porte
6	2032	R\$ 5.389.223	ACIMA — decidir porte
7	2033	R\$ 5.604.792	ACIMA — decidir porte
8	2034	R\$ 5.828.984	ACIMA — decidir porte

Decisão que o investidor precisará tomar. Em valores nominais, um reajuste de apenas 4% ao ano leva a receita a R\$ 4.982.640 já no ano seguinte à estabilização — acima do teto de R\$ 4.800.000 da empresa de pequeno porte. Manter o porte exigirá reduzir volume; a alternativa é assumir o porte maior, para o qual a capacidade instalada já está paga (a planta comporta R\$ 5.732.361 por ano em um turno e o dobro disso em dois turnos). É uma decisão consciente de porte e tributação — não um acidente de projeção.

6 Conferências

VERIFICAÇÃO	RESULTADO	REFERÊNCIA
Soma dos 12 meses do ano 1	R\$ 2.750.000	igual ao plano — exato
Receita do regime (mix × preços)	R\$ 4.791.000	estudo, seção 5.4
Folga para o teto de pequena empresa	R\$ 9.000	LC nº 123/2006, art. 3º, II
Dias de produção no regime	173,0 de 207	capacidade efetiva — estudo, seção 3.7
Mês de maior utilização	79%	outubro de 2027
Série usada na simulação de capacidade de pagamento	2,75 / 3,85 / 4,791 mi	a mesma — comprometimento de 49,1%

GTK Pré-Moldados Ltda · Previsão de Faturamento · data-base agosto de 2026 · valores constantes. Documento derivado do Estudo de Mercado e Plano Mercadológico (146 referências) e da proposta técnico-comercial Gervasi REV00 de 12/05/2026. Premissas de mix, entrada escalonada e sazonalidade são declaradas: a curva define a distribuição; os totais anuais vêm do plano auditado. Arquivos correlatos: previsao-faturamento.xlsx (abertura completa), receitas-bnb.xlsx (layout do formulário), simulacao-fne-bnb.md (capacidade de pagamento).
