

Previsão de Faturamento

GTK PRÉ-MOLDADOS LTDA · CNPJ 66.492.016/0001-77 · Rodovia BR/ES-381, km 35 — Zona Rural, São Mateus – ES

RECEITA DE ESTABILIZAÇÃO	TETO DE PEQUENA EMPRESA	CAPACIDADE EFETIVA ANUAL	UTILIZAÇÃO NO REGIME
R\$ 4.791.000	R\$ 4.800.000	R\$ 5.756.624	83%

Esta previsão abre a receita projetada de **R\$ 4.791.000** por produto, por mês e por ano. Os totais anuais são os do plano de negócios auditado; o que este documento acrescenta é a *distribuição*: quando cada produto entra na venda, como a demanda se comporta ao longo do ano e quanto da capacidade da fábrica é efetivamente utilizada. Valores constantes de agosto de 2026 (sem projeção de inflação), padrão dos projetos de financiamento.

1 Linha do tempo a partir de agora

PERÍODO	FASE	FATURAMENTO	MARCOS
ago-dez/2026	Implantação	R\$ 0	Protocolo FNE; licença ambiental (IEMA) e ligação EDP; galpão e terraplanagem; entrega Gervasi (150-180 dias da proposta de 12/05/2026); montagem (~10 dias); startup, formulação de traços e ensaios NBR 6136/9781
jan-dez/2027	Ano 1 — operação	R\$ 2.750.000	Ramp-up comercial com entrada escalonada dos produtos (detalhe na seção 3)
2028	Ano 2 — consolidação	R\$ 3.850.000	Canais maduros: revendas, construtoras e licitações
2029-2038	Regime	R\$ 4.791.000/ano	Plano-base no teto de pequena empresa (LC nº 123/2006, art. 3º, II)

2 Como a previsão foi construída

CAMADA 1 — O QUE O MERCADO COMPRA DE CADA PRODUTO

As horas da planta são alocadas na proporção em que cada família de produto participa do valor do mercado regional, e não na proporção em que a máquina produz mais rápido. O mix migra ano a ano para produtos de maior valor, conforme a certificação é emitida e os canais amadurecem.

PRODUTO	PREÇO	ANO 1	ANO 2	REGIME	CANAL PREDOMINANTE
Bloco 14×19×39 vedação	R\$ 3,30	45%	40%	36%	Revendas e balcão (autoconstrução)
Bloco 14×19×39 estrutural	R\$ 4,50	20%	23%	26%	Construtoras e habitação econômica
Bloco 9×19×39 vedação	R\$ 2,80	11%	10%	9%	Divisórias e muros
Bloco 19×19×39 + canaletas	R\$ 5,50	3%	3,5%	4%	Complementos da alvenaria estrutural
Paver 35 MPa	R\$ 57,00/m²	21%	23,5%	25%	Prefeituras (B2G) e obras privadas

CAMADA 2 — QUANDO CADA
PRODUTO ENTRA

PRODUTO	ENTRA EM
Bloco 14 vedação e bloco 9	mês 1
Bloco 14 estrutural	mês 3
Paver — obras privadas	mês 4
Paver — B2G	mês 6
Bloco 19 e canaletas	mês 8


O estrutural depende dos ensaios NBR 6136 e do laudo do primeiro traço; o paver público depende de cadastro nas prefeituras, atas e empenho; as canaletas acompanham obras de alvenaria estrutural já iniciadas.

CAMADA 3 — SAZONALIDADE DA CONSTRUÇÃO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,75	0,85	1,00	1,05	1,10	1,10	1,10	1,15	1,15	1,15	1,00	0,60
30%	45%	60%	70%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%

Primeira linha: índice sazonal (soma 12,00). Segunda: curva de ramp-up do ano 1. Janeiro e fevereiro são historicamente os piores meses de venda de cimento no país (chuvas, férias e Carnaval); dezembro concentra férias coletivas e a parada anual de revisão prevista no estudo.

3 Ano 1 mês a mês — R\$ 2.750.000

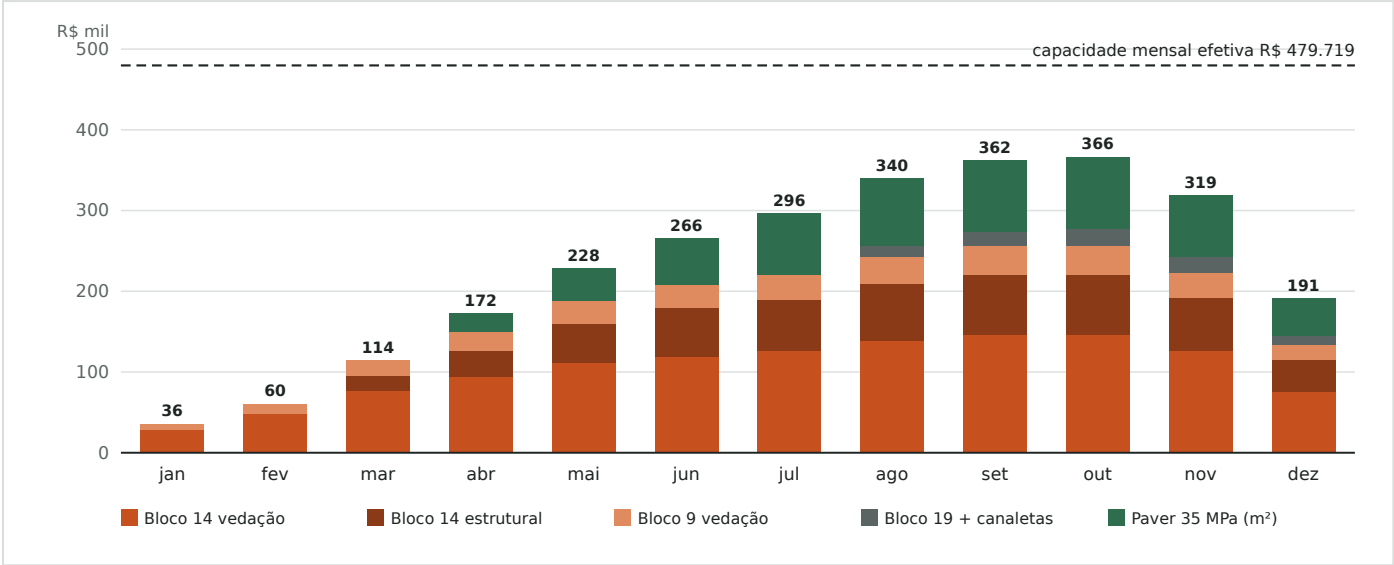

MÊS	BL. 14 VED.	BL. 14 ESTR.	BLOCO 9	BL. 19/CAN.	PAVER	RECEITA	DIAS PROD.	% CAPAC.	MARCO DO MÊS
jan/2027	28.587	—	6.988	—	—	35.575	1,5	7%	início: vedação no varejo e vendas
fev/2027	48.598	—	11.879	—	—	60.477	2,5	13%	
mar/2027	76.232	19.458	18.634	—	—	114.324	4,5	24%	entra o bloco estrutural (laudo NBR)
abr/2027	93.384	33.370	22.827	—	22.481	172.062	6,6	36%	entra o paver — obras privadas
mai/2027	111.807	48.514	27.331	—	40.373	228.025	8,6	48%	
jun/2027	118.795	60.643	29.039	—	57.196	265.672	9,9	55%	entra o paver B2G (cadastros e atas)
jul/2027	125.783	64.210	30.747	—	75.700	296.440	11,0	62%	
ago/2027	138.806	70.858	33.930	12.502	83.538	339.634	12,6	71%	entram bloco 19 e canaletas
set/2027	146.111	74.587	35.716	17.547	87.934	361.896	13,4	75%	
out/2027	146.111	74.587	35.716	21.934	87.934	366.283	13,5	76%	
nov/2027	127.053	64.858	31.057	19.073	76.465	318.507	11,8	66%	
dez/2027	76.232	38.915	18.634	11.444	45.879	191.104	7,1	40%	férias coletivas e parada de revisão
TOTAL	1.237.500	550.000	302.500	82.500	577.500	2.750.000	103,1	—	

Nenhum mês ultrapassa **76% da capacidade mensal efetiva** (R\$ 479.719), e o ano consome **103,1 dos 210 dias efetivos** disponíveis — o ramp-up cabe na planta com folga, sem segundo turno nem hora extra.

4 Evolução anual e quantidades

ANO	CALENDÁRIO	RECEITA	DIAS DE PRODUÇÃO	% CAPAC. EFETIVA	FASE
1	2027	R\$ 2.750.000	103,1	49%	ramp-up
2	2028	R\$ 3.850.000	142,2	68%	consolidação
3	2029	R\$ 4.791.000	174,8	83%	regime — teto EPP
4	2030	R\$ 4.791.000	174,8	83%	regime — teto EPP
5	2031	R\$ 4.791.000	174,8	83%	regime — teto EPP
6	2032	R\$ 4.791.000	174,8	83%	regime — teto EPP
7	2033	R\$ 4.791.000	174,8	83%	regime — teto EPP
8	2034	R\$ 4.791.000	174,8	83%	regime — teto EPP
9	2035	R\$ 4.791.000	174,8	83%	regime — teto EPP
10	2036	R\$ 4.791.000	174,8	83%	regime — teto EPP
11	2037	R\$ 4.791.000	174,8	83%	regime — teto EPP
12	2038	R\$ 4.791.000	174,8	83%	regime — teto EPP

QUANTIDADES VENDIDAS E PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO (FORMATO DO FORMULÁRIO DO BANCO)

PRODUTO	PREÇO UNIT.	ANO 1	ANO 2	REGIME (QTD. PROJETADA)	% ANO 1	% ANO 2	% ANO 3+
Bloco 14 vedação	R\$ 3,30	375.000 un	466.667 un	522.655 un	71,7%	89,3%	100%
Bloco 14 estrutural	R\$ 4,50	122.222 un	196.778 un	276.813 un	44,2%	71,1%	100%
Bloco 9 vedação	R\$ 2,80	108.036 un	137.500 un	153.996 un	70,2%	89,3%	100%
Bloco 19 + canaletas	R\$ 5,50	15.000 un	24.500 un	34.844 un	43,0%	70,3%	100%
Paver 35 MPa (m²)	R\$ 57,00	10.132 m²	15.873 m²	21.013 m²	48,2%	75,5%	100%

Na aba Receitas/Atividades do banco, a empresa entra com **Qtd. Atual = 0** (implantação) e **Qtd. Produzida = % de Utilização × Qtd. Projetada**. Os percentuais menores do ano 1 no estrutural, nas canaletas e no paver não são conservadorismo genérico: são a tradução numérica do calendário de entrada da camada 2.

5 Alerta: valores constantes × valores nominais

A projeção acima está em valores constantes de agosto de 2026 — padrão dos projetos de financiamento e conservador, porque não conta com reajuste de preços. Cabe registrar a consequência prática dessa escolha:

ANO	CALENDÁRIO	RECEITA NOMINAL (+4% A.A.)	SITUAÇÃO FRENTE AO TETO EPP
3	2029	R\$ 4.791.000	dentro do teto
4	2030	R\$ 4.982.640	ACIMA — decidir porte
5	2031	R\$ 5.181.946	ACIMA — decidir porte
6	2032	R\$ 5.389.223	ACIMA — decidir porte
7	2033	R\$ 5.604.792	ACIMA — decidir porte
8	2034	R\$ 5.828.984	ACIMA — decidir porte

Decisão que o investidor precisará tomar. Em valores nominais, um reajuste de apenas 4% ao ano leva a receita a R\$ 4.982.640 já no ano seguinte à estabilização — acima do teto de R\$ 4.800.000 da empresa de pequeno porte. Manter o porte exigirá reduzir volume; a alternativa é assumir o porte maior, para o qual a capacidade instalada já está paga (a planta comporta R\$ 5.756.624 por ano em um turno e o dobro disso em dois turnos). É uma decisão consciente de porte e tributação — não um acidente de projeção.

6 Conferências

VERIFICAÇÃO	RESULTADO	REFERÊNCIA
Soma dos 12 meses do ano 1	R\$ 2.750.000	igual ao plano — exato
Receita do regime (mix × preços)	R\$ 4.791.000	estudo, seção 5.4
Folga para o teto de pequena empresa	R\$ 9.000	LC nº 123/2006, art. 3º, II
Dias de produção no regime	174,8 de 210	capacidade efetiva — estudo, seção 3.7
Mês de maior utilização	76%	outubro de 2027
Série usada na simulação de capacidade de pagamento	2,75 / 3,85 / 4,791 mi	a mesma — comprometimento de 49,1%

GTK Pré-Moldados Ltda · Previsão de Faturamento · data-base agosto de 2026 · valores constantes. Documento derivado do Estudo de Mercado e Plano Mercadológico (146 referências) e da proposta técnico-comercial Gervasi REV00 de 12/05/2026. Premissas de mix, entrada escalonada e sazonalidade são declaradas: a curva define a distribuição; os totais anuais vêm do plano auditado. Arquivos correlatos: previsao-faturamento.xlsx (abertura completa), receitas-bnb.xlsx (layout do formulário), simulacao-fne-bnb.md (capacidade de pagamento).
